


Planning Tous Corps d'Etat

Atelier d'Architecture
Jean François BENOIT & Associés

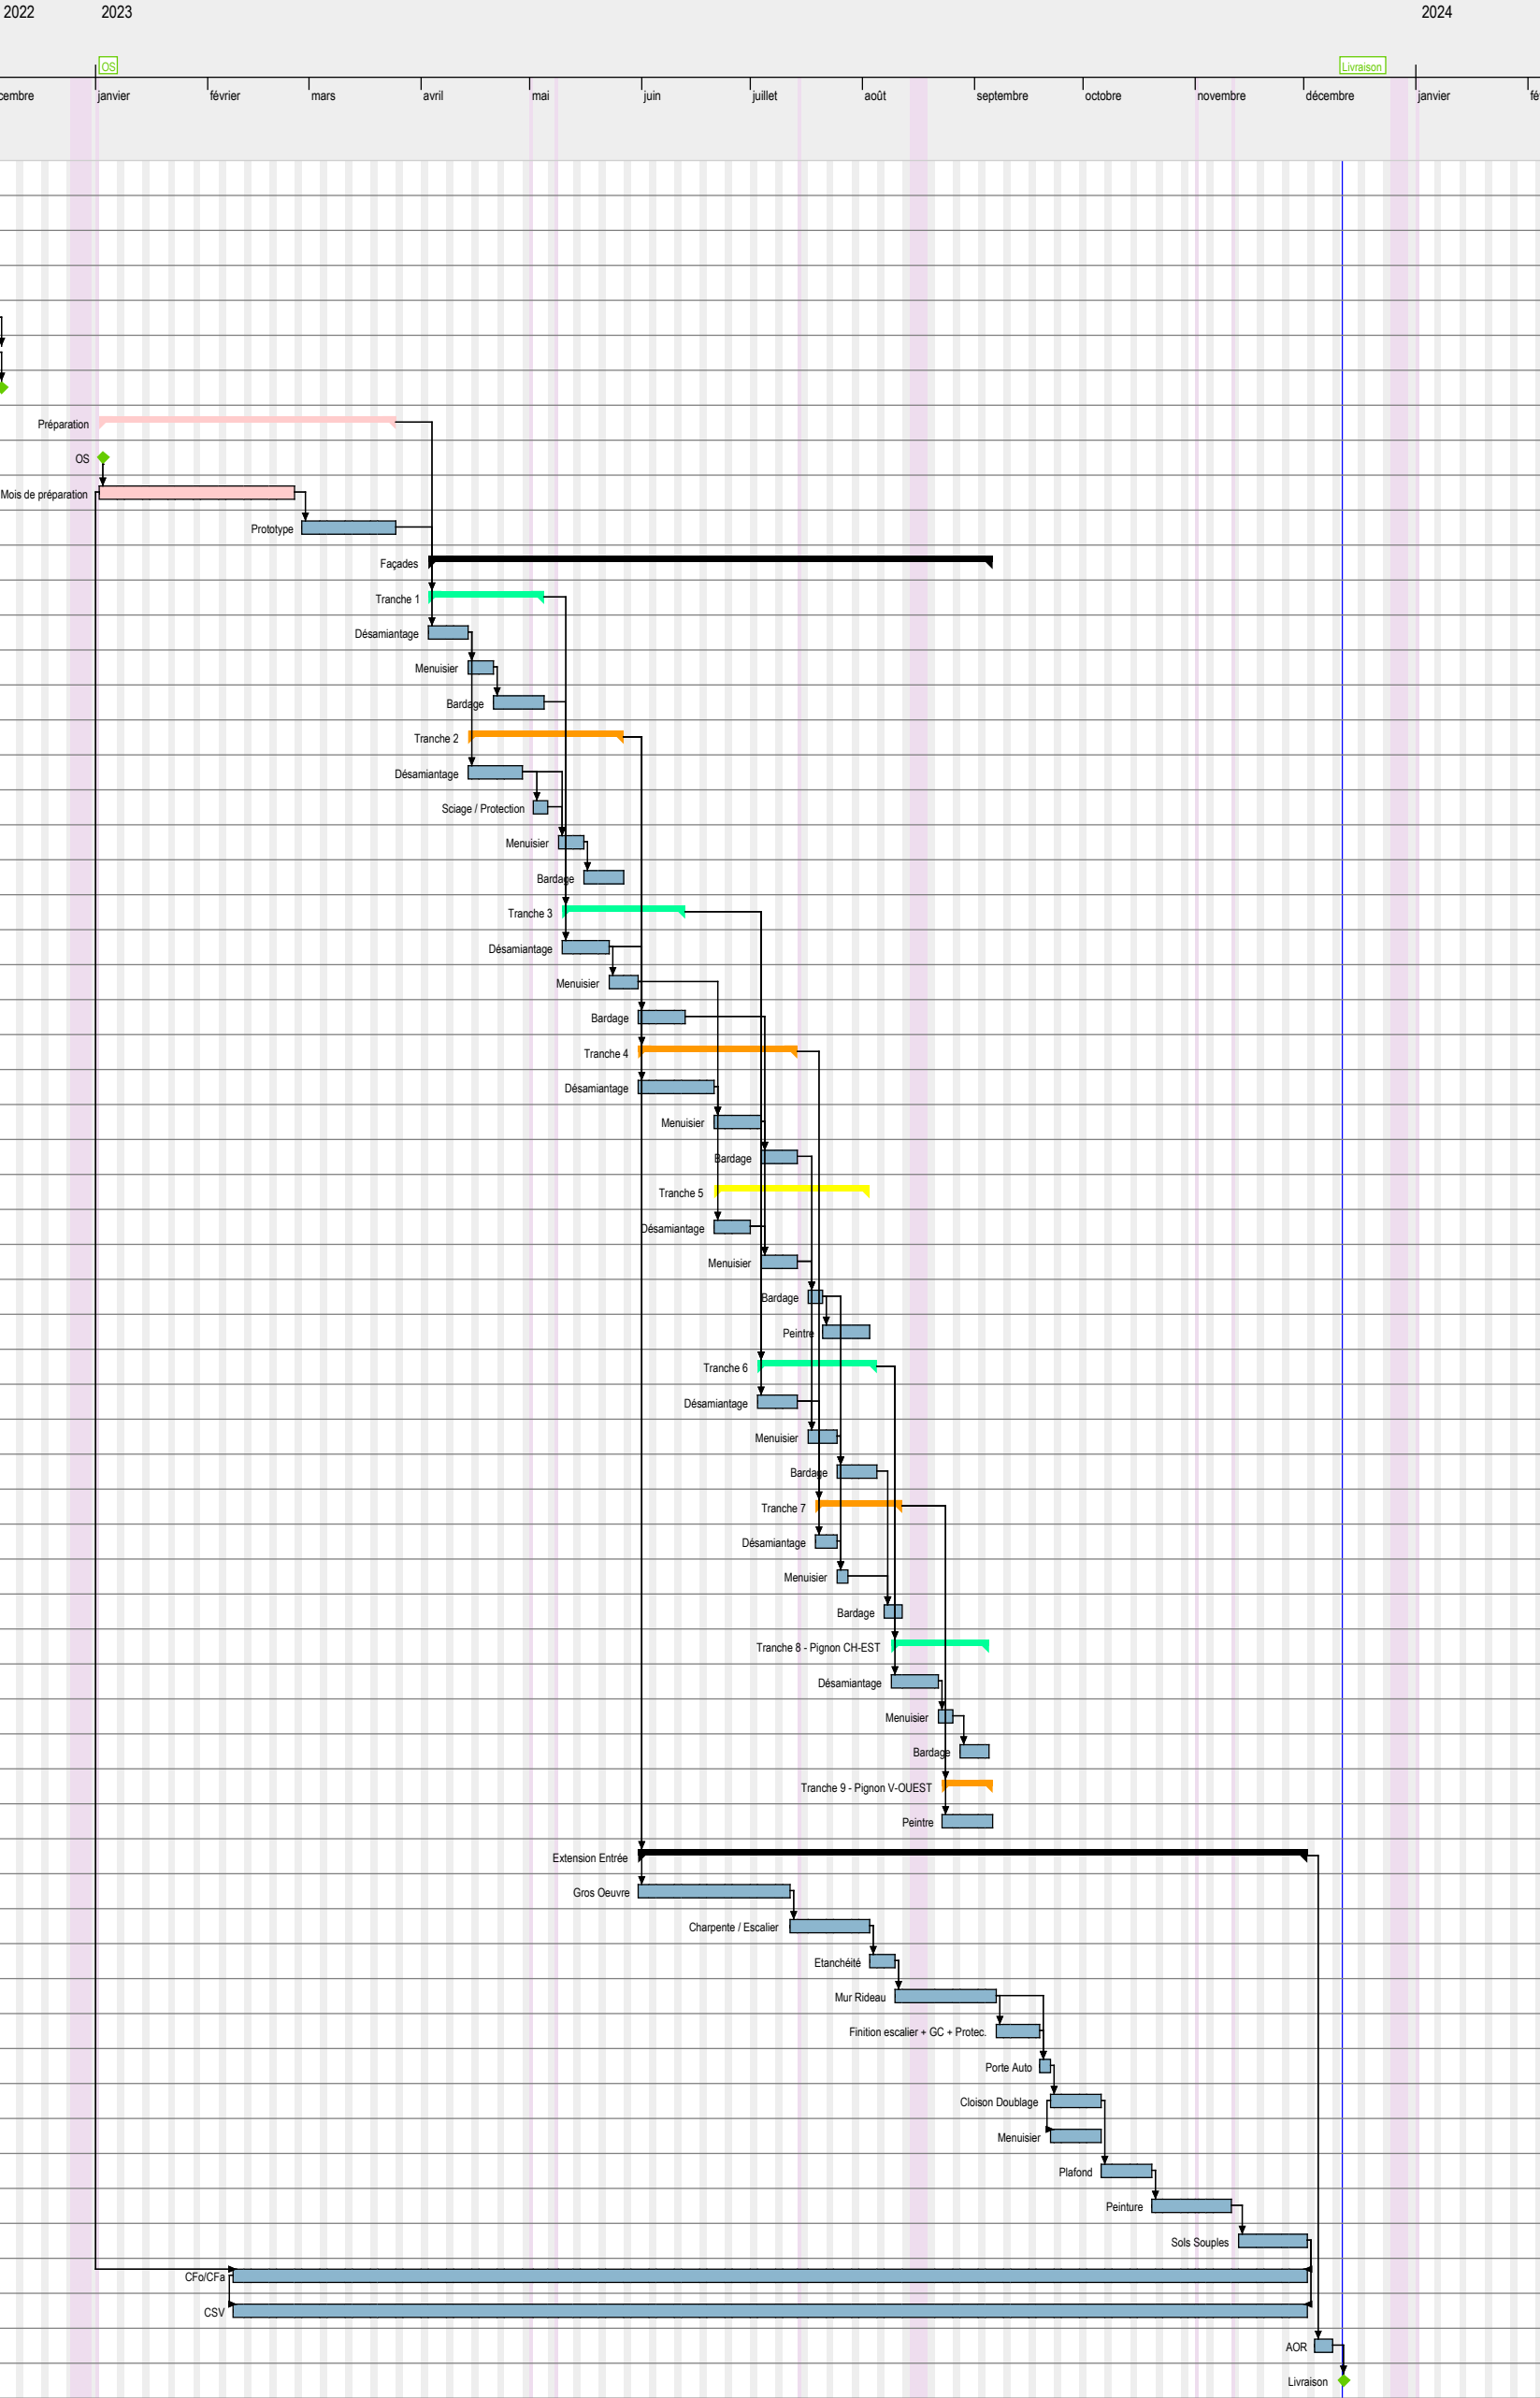

| Nom | Date de début | Date de fin | Durée |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------|
| Etudes | 14/09/2022 | 29/11/2022 | 53 |
| Reprise DCE | 14/09/2022 | 11/10/2022 | 20 |
| Remise DCE | 12/10/2022 | 12/10/2022 | 0 |
| Consutation des entreprises | 12/10/2022 | 02/11/2022 | 15 |
| Analyse des Offres | 03/11/2022 | 15/11/2022 | 8 |
| Mise au point des Marchés | 16/11/2022 | 29/11/2022 | 10 |
| Signature des Marchés | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 0 |
| Préparation | 02/01/2023 | 24/03/2023 | 60 |
| OS | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 0 |
| Mois de préparation | 02/01/2023 | 24/02/2023 | 40 |
| Prototype | 27/02/2023 | 24/03/2023 | 20 |
| Façades | 03/04/2023 | 05/09/2023 | 104 |
| Tranche 1 | 03/04/2023 | 04/05/2023 | 23 |
| Désamiantage | 03/04/2023 | 13/04/2023 | 9 |
| Menuisier | 14/04/2023 | 20/04/2023 | 5 |
| Bardage | 21/04/2023 | 04/05/2023 | 9 |
| Tranche 2 | 14/04/2023 | 26/05/2023 | 29 |
| Désamiantage | 14/04/2023 | 28/04/2023 | 11 |
| Sciage / Protection | 02/05/2023 | 05/05/2023 | 4 |
| Menuisier | 09/05/2023 | 15/05/2023 | 5 |
| Bardage | 16/05/2023 | 26/05/2023 | 9 |
| Tranche 3 | 10/05/2023 | 12/06/2023 | 24 |
| Désamiantage | 10/05/2023 | 22/05/2023 | 9 |
| Menuisier | 23/05/2023 | 30/05/2023 | 6 |
| Bardage | 31/05/2023 | 12/06/2023 | 9 |
| Tranche 4 | 31/05/2023 | 13/07/2023 | 32 |
| Désamiantage | 31/05/2023 | 20/06/2023 | 15 |
| Menuisier | 21/06/2023 | 03/07/2023 | 9 |
| Bardage | 04/07/2023 | 13/07/2023 | 8 |
| Tranche 5 | 21/06/2023 | 02/08/2023 | 30 |
| Désamiantage | 21/06/2023 | 30/06/2023 | 8 |
| Menuisier | 04/07/2023 | 13/07/2023 | 8 |
| Bardage | 17/07/2023 | 20/07/2023 | 4 |
| Peintre | 21/07/2023 | 02/08/2023 | 9 |
| Tranche 6 | 03/07/2023 | 04/08/2023 | 24 |
| Désamiantage | 03/07/2023 | 13/07/2023 | 9 |
| Menuisier | 17/07/2023 | 24/07/2023 | 6 |
| Bardage | 25/07/2023 | 04/08/2023 | 9 |
| Tranche 7 | 19/07/2023 | 11/08/2023 | 18 |
| Désamiantage | 19/07/2023 | 24/07/2023 | 4 |
| Menuisier | 25/07/2023 | 27/07/2023 | 3 |
| Bardage | 07/08/2023 | 11/08/2023 | 5 |
| Tranche 8 - Pignon CH-EST | 09/08/2023 | 04/09/2023 | 14 |
| Désamiantage | 09/08/2023 | 21/08/2023 | 4 |
| Menuisier | 22/08/2023 | 25/08/2023 | 4 |
| Bardage | 28/08/2023 | 04/09/2023 | 6 |
| Tranche 9 - Pignon V-OUEST | 23/08/2023 | 05/09/2023 | 10 |
| Peintre | 23/08/2023 | 05/09/2023 | 10 |
| Extension Entrée | 31/05/2023 | 01/12/2023 | 126 |
| Gros Oeuvre | 31/05/2023 | 11/07/2023 | 30 |
| Charpente / Escalier | 12/07/2023 | 02/08/2023 | 15 |
| Etanchéité | 03/08/2023 | 09/08/2023 | 5 |
| Mur Rideau | 10/08/2023 | 06/09/2023 | 15 |
| Finition escalier + GC + Protec. | 07/09/2023 | 18/09/2023 | 8 |
| Porte Auto | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 3 |
| Cloison Doublage | 22/09/2023 | 05/10/2023 | 10 |
| Menuisier | 22/09/2023 | 05/10/2023 | 10 |
| Plafond | 06/10/2023 | 19/10/2023 | 10 |
| Peinture | 20/10/2023 | 10/11/2023 | 15 |
| Sols Souples | 13/11/2023 | 01/12/2023 | 15 |
| CFo/CFa | 08/02/2023 | 01/12/2023 | 204 |
| CSV | 08/02/2023 | 01/12/2023 | 204 |

| Nom | Date de début | Date de fin | Durée |
|-----------|---------------|-------------|-------|
| AOR | 04/12/2023 | 08/12/2023 | 5 |
| Livraison | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 0 |
