


Atelier d'Architecture

NORMANDON & JARDIN

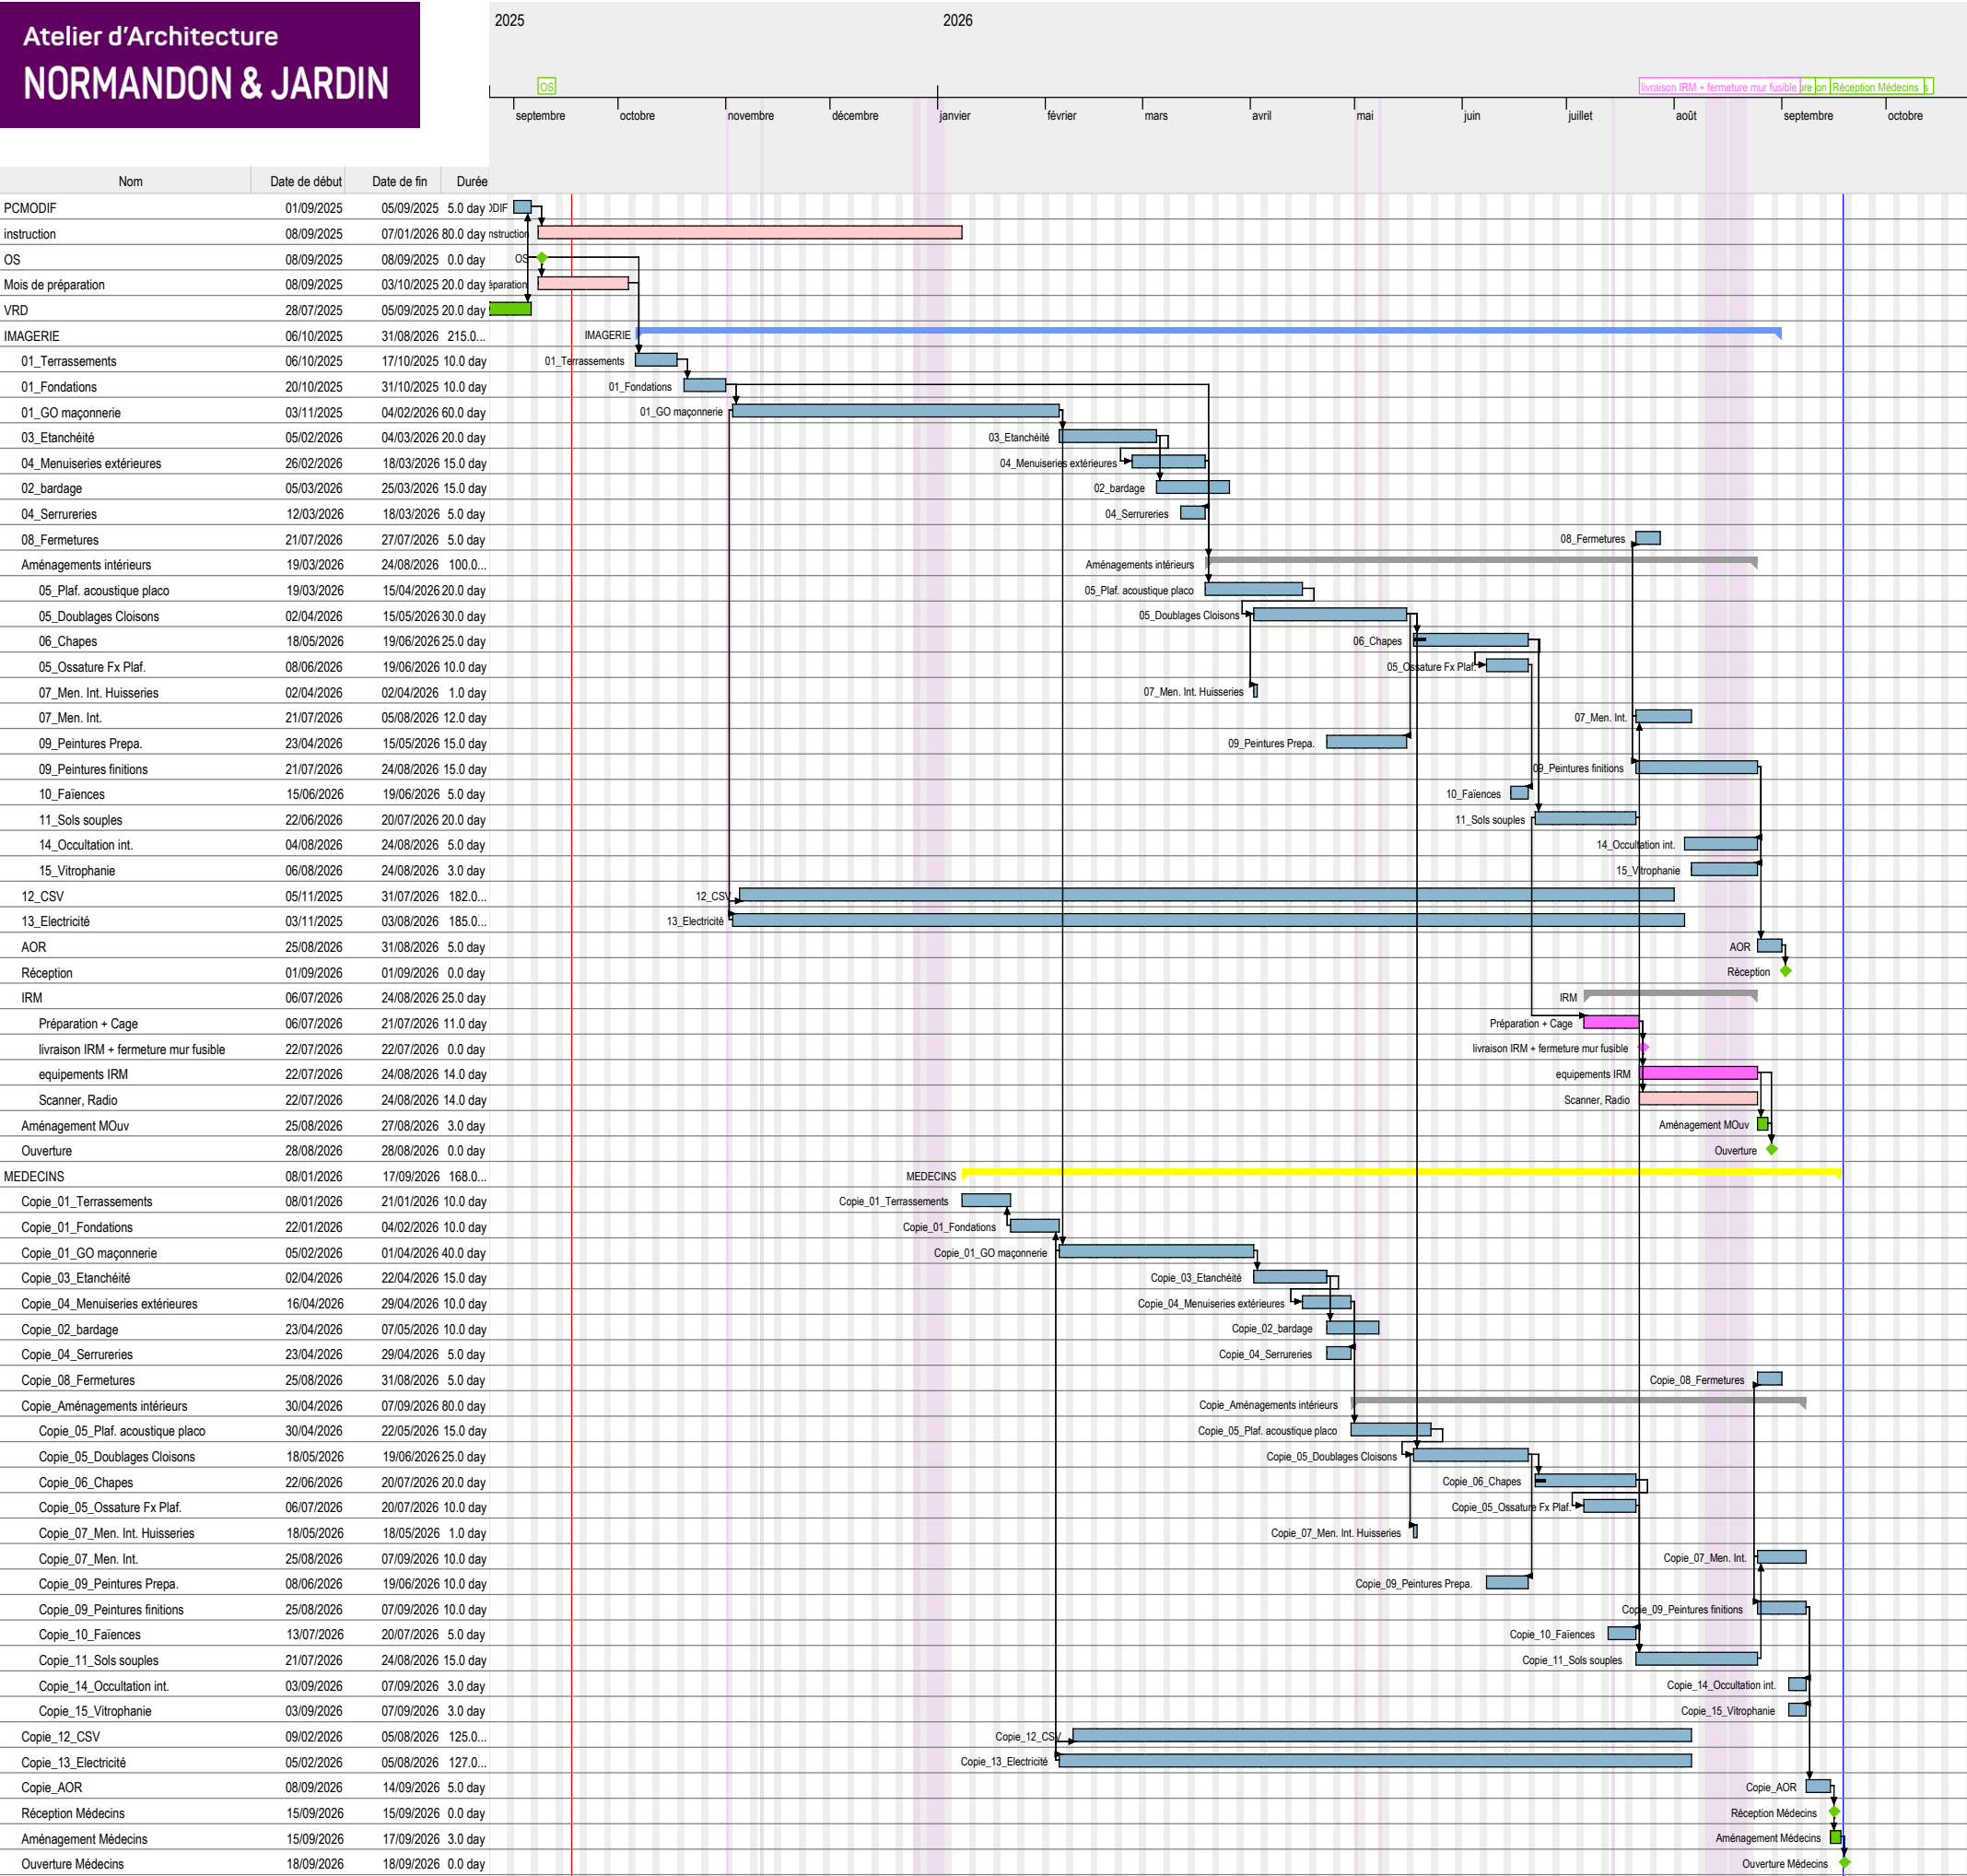

Nom	Date de début	Date de fin	Durée
PCMODIF	01/09/2025	05/09/2025	5
instruction	08/09/2025	07/01/2026	80
OS	08/09/2025	08/09/2025	0
Mois de préparation	08/09/2025	03/10/2025	20
VRD	28/07/2025	05/09/2025	20
IMAGERIE	06/10/2025	31/08/2026	215
01_Terrassements	06/10/2025	17/10/2025	10
01_Fondations	20/10/2025	31/10/2025	10
01_GO maçonnerie	03/11/2025	04/02/2026	60
03_Etanchéité	05/02/2026	04/03/2026	20
04_Menuiseries extérieures	26/02/2026	18/03/2026	15
02_bardage	05/03/2026	25/03/2026	15
04_Serrureries	12/03/2026	18/03/2026	5
08_Fermetures	21/07/2026	27/07/2026	5
Aménagements intérieurs	19/03/2026	24/08/2026	100
05_Plaf. acoustique placo	19/03/2026	15/04/2026	20
05_Doublages Cloisons	02/04/2026	15/05/2026	30
06_Chapes	18/05/2026	19/06/2026	25
05_Ossature Fx Plaf.	08/06/2026	19/06/2026	10
07_Men. Int. Huisseries	02/04/2026	02/04/2026	1
07_Men. Int.	21/07/2026	05/08/2026	12
09_Peintures Prepa.	23/04/2026	15/05/2026	15
09_Peintures finitions	21/07/2026	24/08/2026	15
10_Faïences	15/06/2026	19/06/2026	5
11_Sols souples	22/06/2026	20/07/2026	20
14_Occultation int.	04/08/2026	24/08/2026	5
15_Vitrophanie	06/08/2026	24/08/2026	3
12_CSV	05/11/2025	31/07/2026	182
13_Electricité	03/11/2025	03/08/2026	185
AOR	25/08/2026	31/08/2026	5
Réception	01/09/2026	01/09/2026	0
IRM	06/07/2026	24/08/2026	25
Préparation + Cage	06/07/2026	21/07/2026	11
livraison IRM + fermeture mur fusible	22/07/2026	22/07/2026	0
equipements IRM	22/07/2026	24/08/2026	14
Scanner, Radio	22/07/2026	24/08/2026	14
Aménagement MOuv	25/08/2026	27/08/2026	3
Ouverture	28/08/2026	28/08/2026	0
MEDECINS	08/01/2026	17/09/2026	168
Copie_01_Terrassements	08/01/2026	21/01/2026	10
Copie_01_Fondations	22/01/2026	04/02/2026	10
Copie_01_GO maçonnerie	05/02/2026	01/04/2026	40
Copie_03_Etanchéité	02/04/2026	22/04/2026	15
Copie_04_Menuiseries extérieures	16/04/2026	29/04/2026	10
Copie_02_bardage	23/04/2026	07/05/2026	10
Copie_04_Serrureries	23/04/2026	29/04/2026	5
Copie_08_Fermetures	25/08/2026	31/08/2026	5
Copie_Aménagements intérieurs	30/04/2026	07/09/2026	80
Copie_05_Plaf. acoustique placo	30/04/2026	22/05/2026	15
Copie_05_Doublages Cloisons	18/05/2026	19/06/2026	25
Copie_06_Chapes	22/06/2026	20/07/2026	20
Copie_05_Ossature Fx Plaf.	06/07/2026	20/07/2026	10
Copie_07_Men. Int. Huisseries	18/05/2026	18/05/2026	1
Copie_07_Men. Int.	25/08/2026	07/09/2026	10
Copie_09_Peintures Prepa.	08/06/2026	19/06/2026	10
Copie_09_Peintures finitions	25/08/2026	07/09/2026	10
Copie_10_Faïences	13/07/2026	20/07/2026	5
Copie_11_Sols souples	21/07/2026	24/08/2026	15
Copie_14_Occultation int.	03/09/2026	07/09/2026	3
Copie_15_Vitrophanie	03/09/2026	07/09/2026	3
Copie_12_CSV	09/02/2026	05/08/2026	125
Copie_13_Electricité	05/02/2026	05/08/2026	127
Copie_AOR	08/09/2026	14/09/2026	5
Réception Médecins	15/09/2026	15/09/2026	0
Aménagement Médecins	15/09/2026	17/09/2026	3
Ouverture Médecins	18/09/2026	18/09/2026	0
