


2025

2026

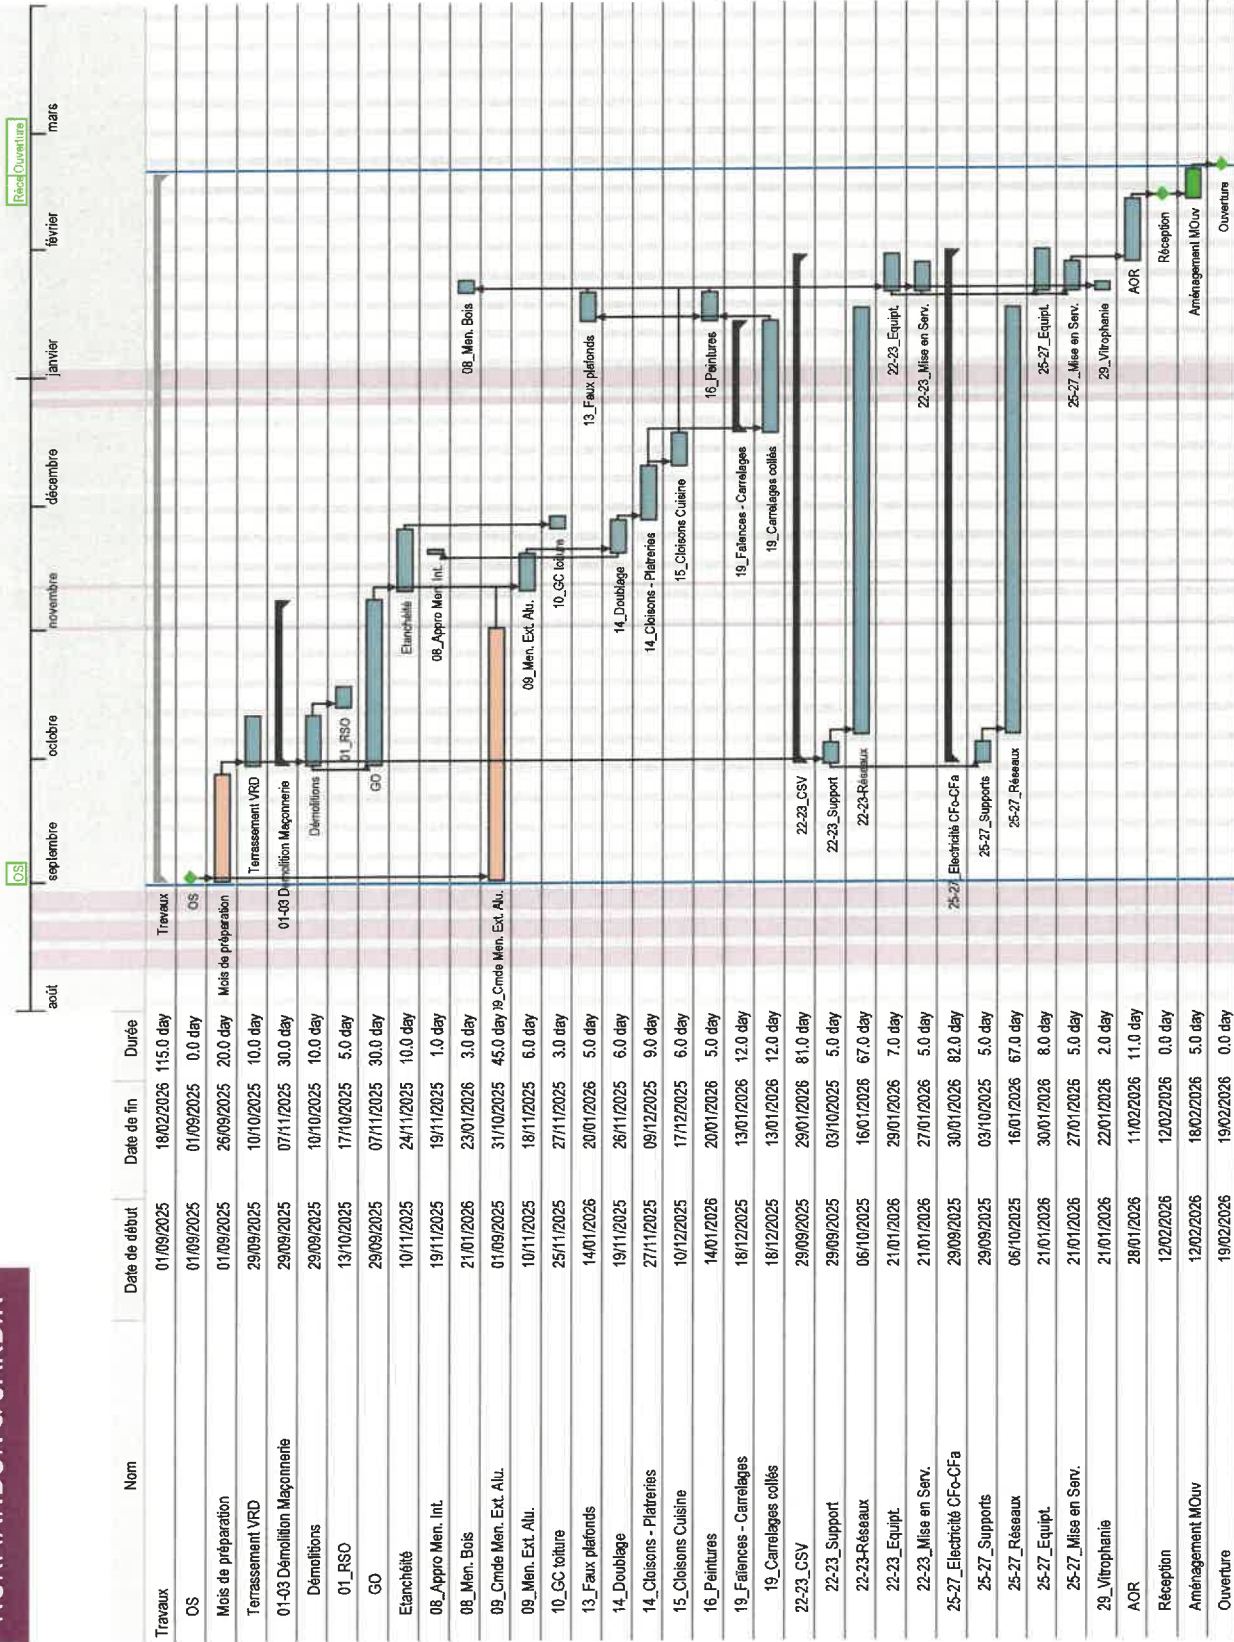

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	Durée
Travaux	01/09/2025	18/02/2026	115
OS	01/09/2025	01/09/2025	0
Mois de préparation	01/09/2025	26/09/2025	20
Terrassement VRD	29/09/2025	10/10/2025	10
01-03 Démolition Maçonnerie	29/09/2025	07/11/2025	30
Démolitions	29/09/2025	10/10/2025	10
01_RSO	13/10/2025	17/10/2025	5
GO	29/09/2025	07/11/2025	30
Etianchéié	10/11/2025	24/11/2025	10
08_Appro Men. Int.	19/11/2025	19/11/2025	1
08_Men. Bois	21/01/2026	23/01/2026	3
09_Cmde Men. Ext. Alu.	01/09/2025	31/10/2025	45
09_Men. Ext. Alu.	10/11/2025	18/11/2025	6
10_GC toiture	25/11/2025	27/11/2025	3
13_Faux plafonds	14/01/2026	20/01/2026	5
14_Doublage	19/11/2025	26/11/2025	6
14_Cloisons - Plâtres	27/11/2025	09/12/2025	9
15_Cloisons Cuisine	10/12/2025	17/12/2025	6
16_Peintures	14/01/2026	20/01/2026	5
19_Faïences - Carrelages	18/12/2025	13/01/2026	12
19_Carrelages collés	18/12/2025	13/01/2026	12
22-23_CSV	29/09/2025	29/01/2026	81
22-23_Support	29/09/2025	03/10/2025	5
22-23_Réseaux	06/10/2025	16/01/2026	67
22-23_Equipt	21/01/2026	29/01/2026	7
22-23_Mise en Serv.	21/01/2026	27/01/2026	5
25-27_Electricité CFo-CFa	29/09/2025	30/01/2026	82
25-27_Supports	29/09/2025	03/10/2025	5
25-27_Réseaux	06/10/2025	16/01/2026	67
25-27_Equipt	21/01/2026	30/01/2026	8
25-27_Mise en Serv.	21/01/2026	27/01/2026	5
29_Vitrophanie	21/01/2026	22/01/2026	2
AOR	28/01/2026	11/02/2026	11
Réception	12/02/2026	12/02/2026	0
Aménagement MOuv	12/02/2026	18/02/2026	5
Ouverture	19/02/2026	19/02/2026	0
