


Atelier d'Architecture

NORMANDON & JARDIN

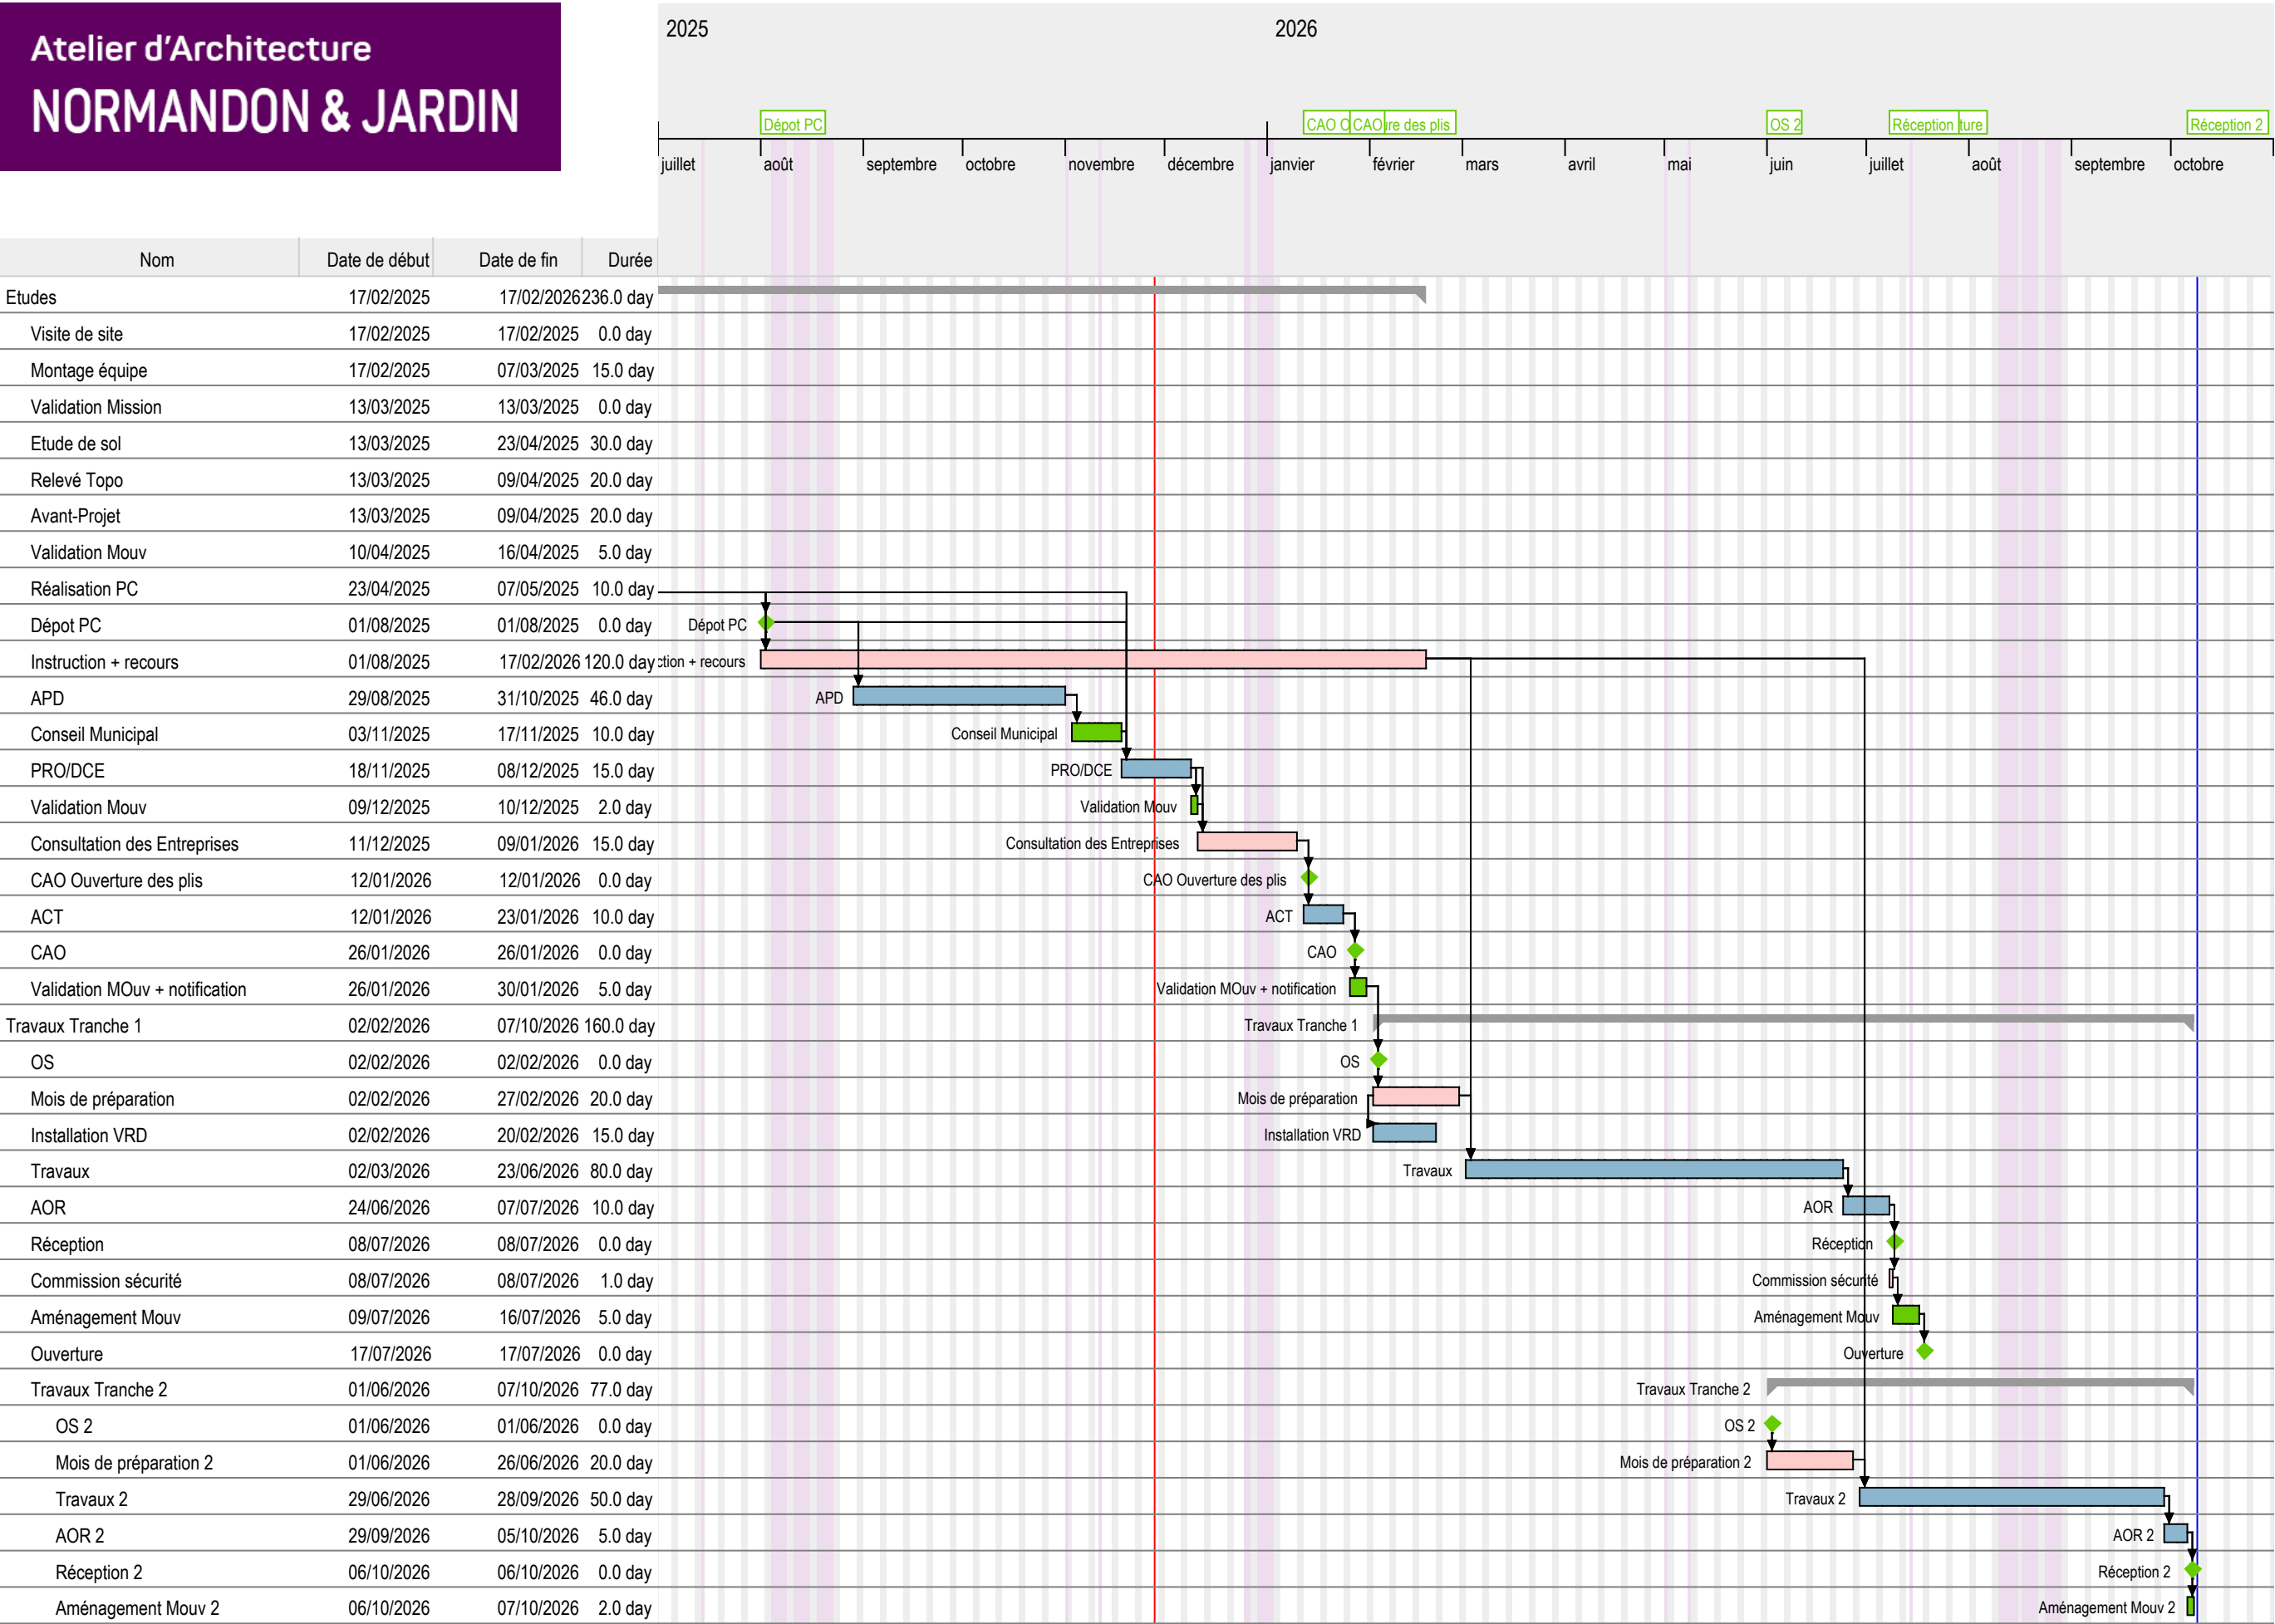

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	Durée
Etudes	17/02/2025	17/02/2026	236
Visite de site	17/02/2025	17/02/2025	0
Montage équipe	17/02/2025	07/03/2025	15
Validation Mission	13/03/2025	13/03/2025	0
Etude de sol	13/03/2025	23/04/2025	30
Relevé Topo	13/03/2025	09/04/2025	20
Avant-Projet	13/03/2025	09/04/2025	20
Validation Mouv	10/04/2025	16/04/2025	5
Réalisation PC	23/04/2025	07/05/2025	10
Dépot PC	01/08/2025	01/08/2025	0
Instruction + recours	01/08/2025	17/02/2026	120
APD	29/08/2025	31/10/2025	46
Conseil Municipal	03/11/2025	17/11/2025	10
PRO/DCE	18/11/2025	08/12/2025	15
Validation Mouv	09/12/2025	10/12/2025	2
Consultation des Entreprises	11/12/2025	09/01/2026	15
CAO Ouverture des plis	12/01/2026	12/01/2026	0
ACT	12/01/2026	23/01/2026	10
CAO	26/01/2026	26/01/2026	0
Validation MOuv + notification	26/01/2026	30/01/2026	5
Travaux Tranche 1	02/02/2026	07/10/2026	160
OS	02/02/2026	02/02/2026	0
Mois de préparation	02/02/2026	27/02/2026	20
Installation VRD	02/02/2026	20/02/2026	15
Travaux	02/03/2026	23/06/2026	80
AOR	24/06/2026	07/07/2026	10
Réception	08/07/2026	08/07/2026	0
Commission sécurité	08/07/2026	08/07/2026	1
Aménagement Mouv	09/07/2026	16/07/2026	5
Ouverture	17/07/2026	17/07/2026	0
Travaux Tranche 2	01/06/2026	07/10/2026	77
OS 2	01/06/2026	01/06/2026	0
Mois de préparation 2	01/06/2026	26/06/2026	20
Travaux 2	29/06/2026	28/09/2026	50
AOR 2	29/09/2026	05/10/2026	5
Réception 2	06/10/2026	06/10/2026	0
Aménagement Mouv 2	06/10/2026	07/10/2026	2
