PLANNING EXTENSION GRAND PLACE_KLEPIERRE ECHIROLLES
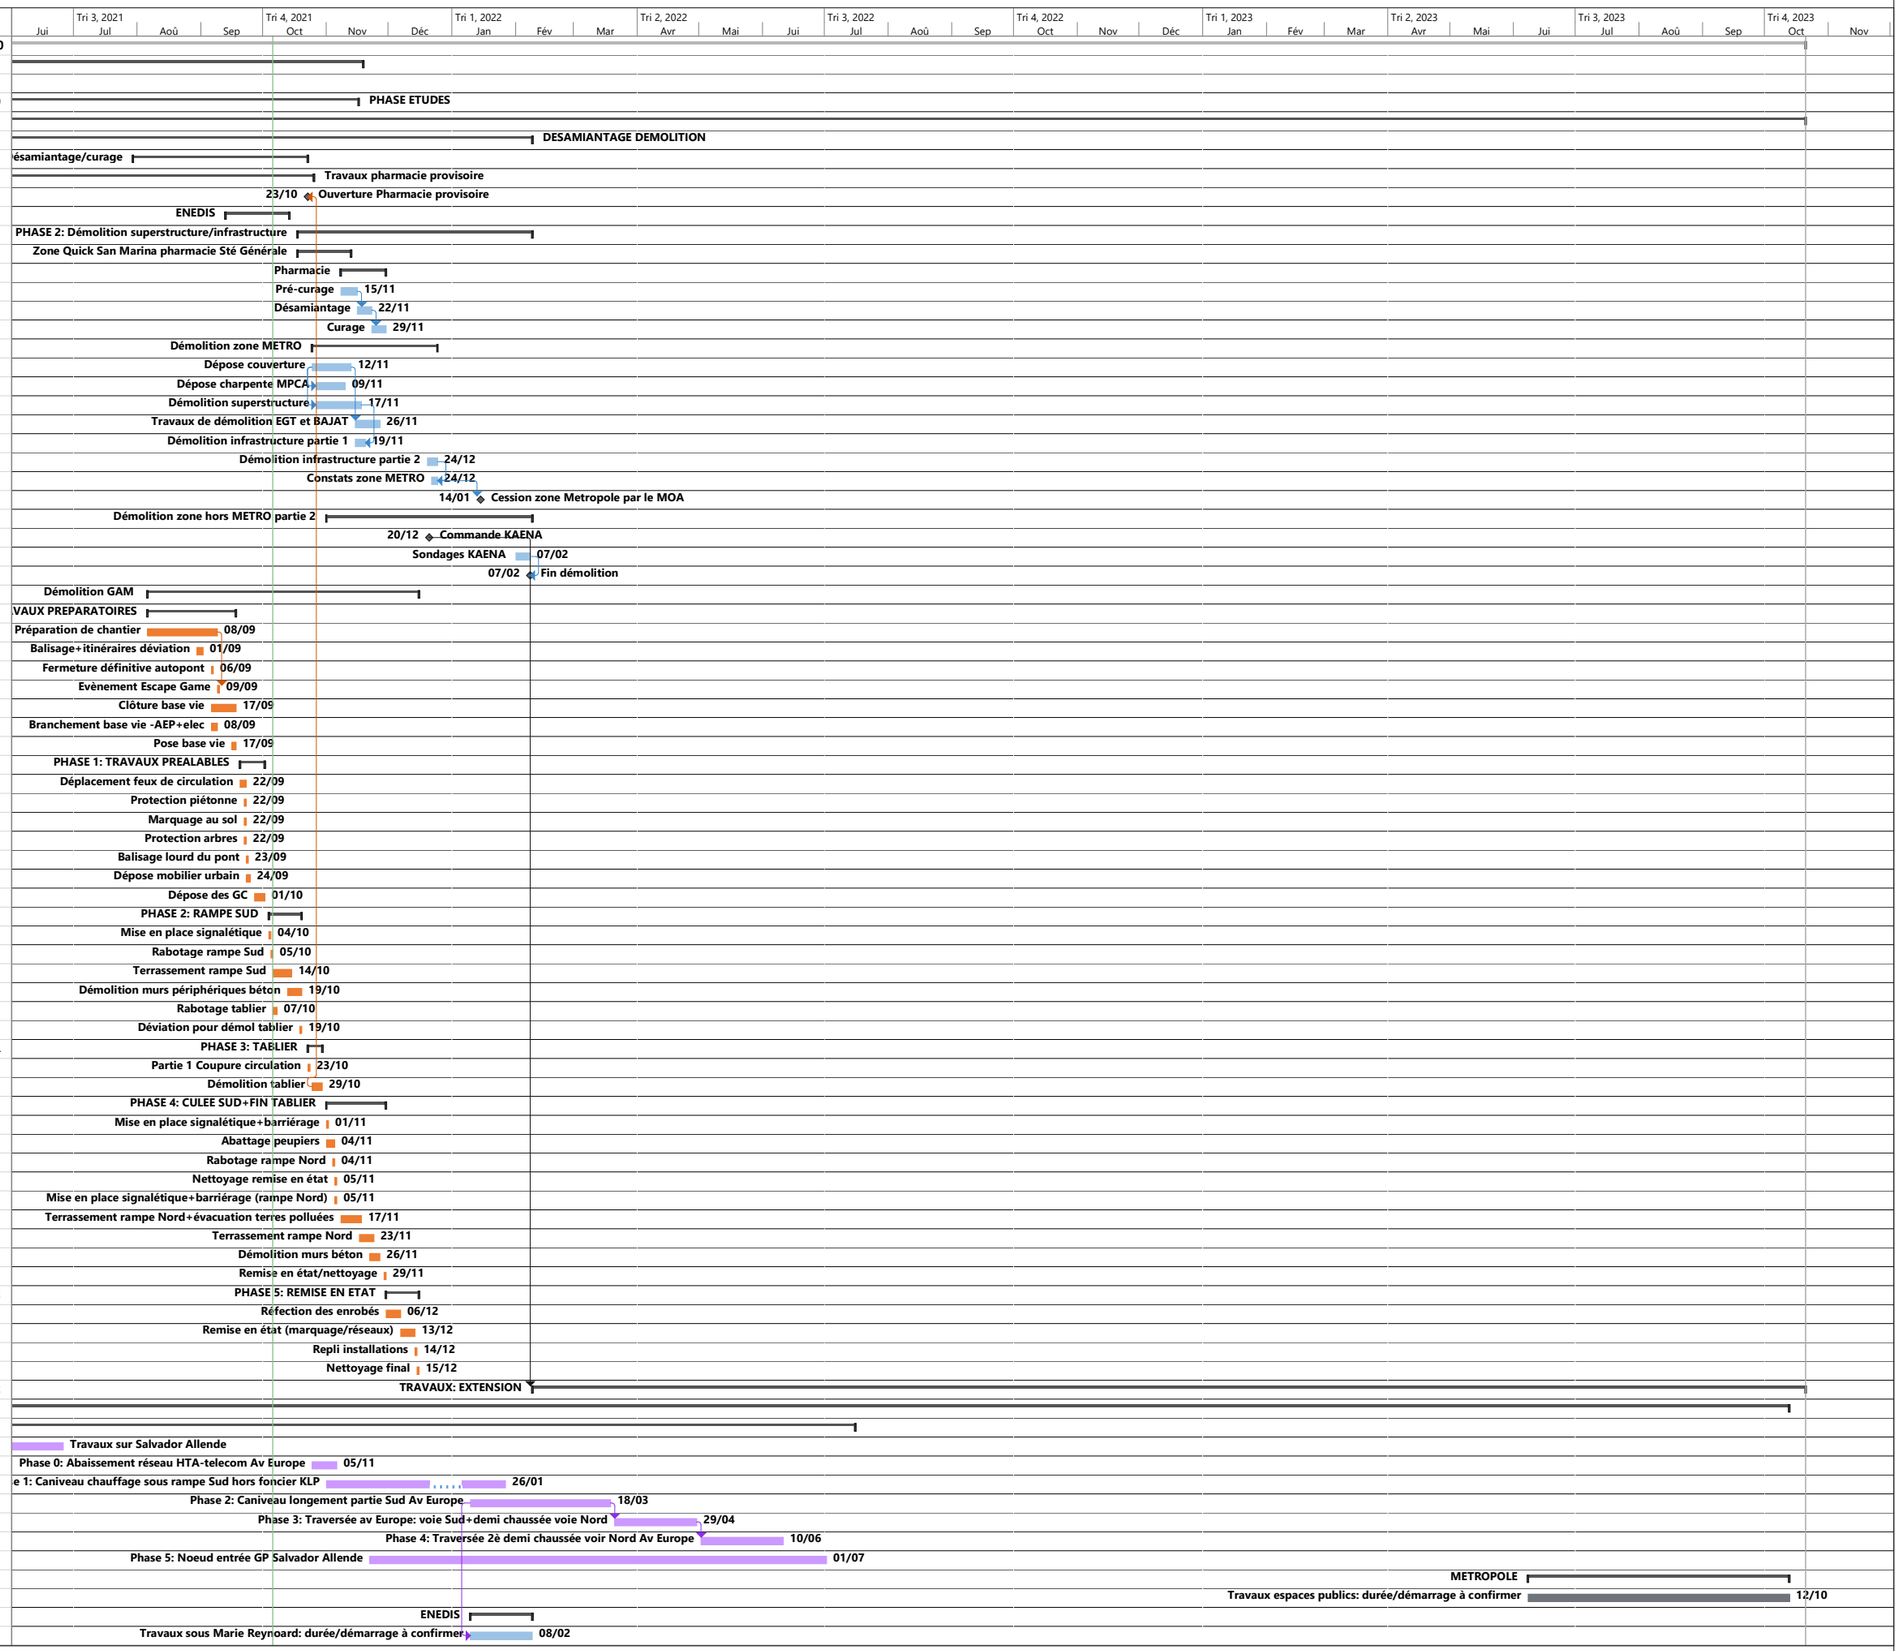
N°	Nom de la tâche	Durée	Début
0	**EXTENSION GRAND PLACE**	**738 jrs?**	**Lun 19/10/20**
1	**Chantier rénovation**	**230 jrs?**	**Lun 21/12/20**
5			
6	**PHASE ETUDES**	**230,92 jrs**	**Mer 16/12/20**
221	**PHASE TRAVAUX KLEPIERRE**	**738 jrs?**	**Lun 19/10/20**
222	**DESAMIANTAGE DEMOLITION**	**332 jrs?**	**Lun 19/10/20**
223	**PHASE 1 : Désamiantage/curage**	**61 jrs**	**Ven 30/07/21**
262	**Travaux pharmacie provisoire**	**257 jrs**	**Lun 19/10/20**
305	Ouverture Pharmacie provisoire	0 jr	Sam 23/10/21
306	**ENEDIS**	**23 jrs**	**Lun 13/09/21**
309	**PHASE 2: Démolition superstructure/infrastructure**	**82 jrs**	**Lun 18/10/21**
310	**Zone Quick San Marina pharmacie Sté Générale**	**20 jrs**	**Lun 18/10/21**
314	**Pharmacie**	**15 jrs**	**Lun 08/11/21**
315	Pré-curage	5 jrs	Lun 08/11/21
316	Désamiantage	5 jrs	Mar 16/11/21
317	Curage	5 jrs	Mar 23/11/21
318	**Démolition zone METRO**	**44 jrs**	**Lun 25/10/21**
319	Dépose couverture	14 jrs	Lun 25/10/21
320	Dépose charpente MPCA	10 jrs	Mer 27/10/21
321	Démolition superstructure	15 jrs	Mer 27/10/21
322	Travaux de démolition EGT et BAJAT	10 jrs	Lun 15/11/21
323	Démolition infrastructure partie 1	5 jrs	Lun 15/11/21
324	Démolition infrastructure partie 2	5 jrs	Lun 20/12/21
325	Constats zone METRO	3 jrs	Mer 22/12/21
326	Cession zone Metropole par le MOA	0 jr	Ven 14/01/22
327	**Démolition zone hors METRO partie 2**	**71 jrs**	**Lun 01/11/21**
337	Commande KAENA	0 jr	Lun 20/12/21
338	Sondages KAENA	5 jrs	Mar 01/02/22
339	Fin démolition	0 jr	Lun 07/02/22
340	**Démolition GAM**	**94 jrs?**	**Ven 06/08/21**
341	**PHASE 0: TRAVAUX PREPARATOIRES**	**31 jrs**	**Ven 06/08/21**
342	Préparation de chantier	24 jrs	Ven 06/08/21
343	Balisage+itinéraires déviation	3 jrs	Lun 30/08/21
344	Fermeture définitive autopont	1 jr	Lun 06/09/21
345	Evènement Escape Game	1 jr	Jeu 09/09/21
346	Clôture base vie	10 jrs	Lun 06/09/21
347	Branchement base vie -AEP+elec	3 jrs	Lun 06/09/21
348	Pose base vie	2 jrs	Jeu 16/09/21
349	**PHASE 1: TRAVAUX PREALABLES**	**10 jrs**	**Lun 20/09/21**
350	Déplacement feux de circulation	3 jrs	Lun 20/09/21
351	Protection piétonne	1 jr	Mer 22/09/21
352	Marquage au sol	1 jr	Mer 22/09/21
353	Protection arbres	1 jr	Mer 22/09/21
354	Balisage lourd du pont	1 jr	Jeu 23/09/21
355	Dépose mobilier urbain	2 jrs	Jeu 23/09/21
356	Dépose des GC	5 jrs	Lun 27/09/21
357	**PHASE 2: RAMPE SUD**	**12 jrs**	**Lun 04/10/21**
358	Mise en place signalétique	1 jr	Lun 04/10/21
359	Rabotage rampe Sud	1 jr	Mar 05/10/21
360	Terrassement rampe Sud	7 jrs	Mer 06/10/21
361	Démolition murs périphériques béton	5 jrs	Mer 13/10/21
362	Rabotage tablier	2 jrs	Mer 06/10/21
363	Déviation pour démol tablier	1 jr	Mar 19/10/21
364	**PHASE 3: TABLIER**	**6 jrs?**	**Sam 23/10/21**
365	Partie 1 Coupure circulation	1 jr?	Sam 23/10/21
366	Démolition tablier	5 jrs	Lun 25/10/21
367	**PHASE 4: CULEE SUD+FIN TABLIER**	**20 jrs?**	**Lun 01/11/21**
368	Mise en place signalétique+barriérage	1 jr	Lun 01/11/21
369	Abattage peupiers	4 jrs	Lun 01/11/21
370	Rabotage rampe Nord	1 jr	Jeu 04/11/21
371	Nettoyage remise en état	1 jr?	Ven 05/11/21
372	Mise en place signalétique+barriérage (rampe Nord)	1 jr	Ven 05/11/21
373	Terrassement rampe Nord+évacuation terres polluées	7 jrs	Lun 08/11/21
374	Terrassement rampe Nord	5 jrs	Mer 17/11/21
375	Démolition murs béton	5 jrs	Lun 22/11/21
376	Remise en état/nettoyage	1 jr	Lun 29/11/21
377	**PHASE 5: REMISE EN ETAT**	**12 jrs**	**Mar 30/11/21**
378	Réfection des enrobés	5 jrs	Mar 30/11/21
379	Remise en état (marquage/réseaux)	5 jrs	Mar 07/12/21
380	Repli installations	1 jr	Mar 14/12/21
381	Nettoyage final	1 jr	Mer 15/12/21
382	**TRAVAUX: EXTENSION**	**406 jrs**	**Mar 08/02/22**
651	**Chantiers connexes**	**681 jrs?**	**Lun 11/01/21**
652	**Travaux CCIAG**	**393 jrs?**	**Lun 11/01/21**
653	Travaux sur Salvador Allende	120 jrs	Lun 11/01/21
654	Phase 0: Abaissement réseau HTA-telecom Av Europe	10 jrs	Lun 25/10/21
655	Phase 1: Caniveau chauffage sous rampe Sud hors foncier KLP	50 jrs	Lun 01/11/21
656	Phase 2: Caniveau longement partie Sud Av Europe	50 jrs	Lun 10/01/22
657	Phase 3: Traversée av Europe: voie Sud+demi chaussée voie Nord	30 jrs	Lun 21/03/22
658	Phase 4: Traversée 2è demi chaussée voir Nord Av Europe	30 jrs	Lun 02/05/22
659	Phase 5: Noeud entrée GP Salvador Allende	160 jrs	Lun 22/11/21
660	**METROPOLE**	**80 jrs**	**Jeu 08/06/23**
661	Travaux espaces publics: durée/démarrage à confirmer	80 jrs	Jeu 08/06/23
662	**ENEDIS**	**22 jrs**	**Lun 10/01/22**
663	Travaux sous Marie Reynoard: durée/démarrage à confirmer	22 jrs	Lun 10/01/22
